

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Kisfalu Kft.

5.10.....sz. napirend
PDT

ELŐTERJESZTÉS

a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2015. március 16-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Budapest VIII. kerület, Alföldi utca, Delej utca, Sárkány utca, Tisztes utca felújításhoz kapcsolódó pótmunka kifizetésére.

Előterjesztő: Kovács Ottó igazgató

Készítette és leírta: Zsidi Lajos irodavezető

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: Építési napló

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságának 850/2014. (VIII.11.) és 883/2014. (VIII.22.) számú határozatai alapján, az Önkormányzat 2014. szeptember 01-én, valamint 2014. szeptember 04-én vállalkozási szerződést kötött a Stone Dekor Kft.-vel a VIII. kerület Alföldi utca és Sárkány utca, a Delej utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közötti szakasz), és a Tisztes utca (Osztály utca – Törökbecse utca közötti szakasz) útfelújítására.

A műszaki ellenőri feladatokat a Kisfalu Kft. a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 920/2014.(VIII.22.) és 1086/2014.(IX.29.) számú határozatai alapján kötött megbízási szerződés alapján látta el.

Az Alföldi utca és Sárkány utca kivitelezés vonatkozásában vállalkozási szerződés II. 5 pontjában a szerződő felek megállapodtak a vállalkozói díjon felül további 5 % tartalékkeret biztosításáról.

A Delej utca és Tisztes utca kivitelezés vonatkozásában vállalkozási szerződés II. 5 pontjában a szerződő felek megállapodtak a vállalkozói díjon felül további 3 % tartalékkeret biztosításáról.

Tartalékkeret a szerződésben foglalt esetekben használható fel az alábbiak szerint:

Tartalékkeretet kizárólag a megrendelő előzetes hozzájárulása esetén a szerződés szerinti egyes pótmunkákra használható fel.

Pótmunka csak a Vállalkozó külön költségvetése, a pótmunka szükségességének Megrendelő műszaki képviselő általi igazolás, továbbá a Megrendelő külön megrendelése alapján végezhető.

A négy utca felújítása során a pótmunka igények eltérő helyen és eltérő időben jelentkeztek, ezek az építési naplóban rögzítésre kerültek. A pótmunkák elvégzésének szükségességét a műszaki ellenőr az előterjesztés mellékletét képező Építési napló szerint az alábbiak szerint igazolta:

Alföldi utca Kun utca és Orczy út közötti szakasza jelentős gépjármű forgalmat biztosít az átmenő forgalomtól függetlenül a teremgarázsokkal rendelkező társasházak, az FKF Zrt, és a Gyermekvédelmi Szakszolgálat számára. A kivitelezés idejére a teljes útzártól eltérően a kivitelező mindössze három napon történő zárással biztosította az utcában lakók és intézmények és szolgáltatók dolgozóinak a gépkocsiforgalmat. Ennek érdekében az aszfalt alatti, úgynevezett „CKT” – cementkötésű teherhordó réteg helyett C10 minőségű beton készült, amely biztosította az aszfaltozás előtti korlátozott forgalmat. A páratlan oldalon, az FKF Zrt. felőli járdaszakaszt a tervtől

szerződött műszaki tartalomtól eltérően a meglévő fák környezetében szélesíteni kellett. Az Alföldi u. 16-18. számú lakóépület közös képviselője a kivitelezés előrehaladott állapotában jelezte, hogy az épületük négy esővíz levezetője valószínű, hogy nincs rendesen az út alatti közcsatornába kötve. A Kisfalu Kft. a Fővárosi Csatornázási Művektől kamerás vizsgálatot kért a tényleges állapot felderítésére. A vizsgálat igazolta a részben járda, részben parkolósáv alatti bekötések javításának szükségességét.

A Sárkány utcában szintén a lakói igények, valamint a FKF Zrt. hulladékgyűjtő udvar forgalmának biztosítására az Alföldi utcához hasonlóan magasabb minőségű útalap került kialakításra.

Delej utca Golgota utca felőli kereszteződésében olyan mértékben károsodott a nagykockakő burkolat és az alatta lévő útalap, hogy a Delej utca helyreállítását követően esőzések a kereszteződésben felgyülemelő nagymennyiségű csapadékot nem vezetődött volna el, így többlet felület helyreállítása volt indokolt.

Tisztes utca aszfalt pályaszerkezet felső rétegét marással nem lehetett eltávolítani az alatta lévő teherhordó szerkezet rossz állapota miatt. A felújítás során szükséges volt elbontani az meglévő útalapot is és helyén CKT alapot készíteni az új aszfaltburkolat fogadására.

A kivitelezések a 2014. szeptember 04. és szeptember 05-i munkaterület átadással 2014. december 2-i műszaki átadás átvétellel határidőre elkészültek. A vállalkozás szerinti teljesítési határidő mindkét megállapodásban a szerződés hatályba lépésétől számított 90. nap volt.

A Vállalkozó a szerződéses feltételeknek megfelelően teljesített, illetve ezen felül a fent részletezettek szerint szükségszerű pótmunkákat végzett.

Fentiekre tekintettel javasoljuk a Tisztelt Bizottságnak, hogy a Budapest VIII. kerület Alföldi utca és Sárkány utca, Delej utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közötti szakasz), és a Tisztes utca (Osztály utca – Törökbecse utca közötti szakasz) útfelújítás vonatkozásában hagyja jóvá a kivitelező nettó (3.456.400, Ft + Áfa, melyből levonásra kerül a helyesbítő számla összege 236.000 Ft+áfa) 3.220.400 Ft+Áfa, valamint a Delej utca és Tisztes utca vonatkozásában nettó 815.990, Ft + Áfa pótmunka elvégzését, illetve az elvégzett pótmunkáról szóló számlák kifizetését.

II. A beterjesztés indoka

Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala azért szükséges, mert a tényállási részben ismertetett négy utca szakasz felújítása során eltérő időpontokban pótmunkák elvégzése volt indokolt, amelyek kifizetésére a Kivitelező pótszámlát nyújtott be. Az elvégzett pótmunka jóváhagyása, valamint ennek alapján a benyújtott pótszámlák kifizetésének jóváhagyása a Tisztelt Bizottság hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntéssel kifizethetővé válik az útfelújítások során szükségszerűen elvégzett pótmunka vállalkozói díja, amely az Alföldi utca és Sárkány utca kivitelezés vonatkozásában nettó (3.456.400, Ft + Áfa, amelyből levonásra kerül a helyesbítő számla összege 236.000 Ft+Áfa) 3.220.400 Ft+Áfa, illetve a Delej utca és Tisztes utca vonatkozásában nettó 815.990, Ft + Áfa.

A fedezet a 2014. évi pénzmaradvány a 11601 címen biztosított.

IV. Jogszabályi környezet ismertetése

A Tisztelt Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontján alapul.

Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

...../2015 év (03. hó 16. nap). számú Városgazdálkodási és Pénzügyi bizottsági határozat:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy

1. tudomásul veszi a műszaki ellenőr által igazolt, Építési naplóban foglaltak szerinti a Stone Dekor Kft. által a VIII. kerület Alföldi utca és Sárkány utca valamint a Delej utca (Golgota utca - Vajda Péter utca közötti szakasz), és a Tisztes utca (Osztály utca – Törökbecse utca közötti szakasz) útfelújítási munkálatok során kivitelezett pótmunka elvégzését.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. március 16.

2. jóváhagyja az 1. pontban foglalt pótmunka elvégzéséről szóló, a Stone Dekor Kft. által kiállított, nettó (3.456.400, Ft + Áfa, amelyből levonásra kerül a helyesbítő számla összege 236.000 Ft+Áfa) 3.220.400 Ft+Áfa, valamint nettó 815.990, Ft + Áfa összegű pótmunka számláinak kifizetését.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. március 23.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára

(megfelelő aláhúzó!): nem indokolt hirdető táblán honlapon

Budapest, 2015. március 09.


Kovács Ottó
igazgató

KÉSZÍTETTE: KISFALU JÓZSEFVÁROSI VAGYONGAZDÁLKODÓ KFT.

LEÍRTA: ZSIDI LAJOS IRODAVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *2015. márc. 11. a 1169/c*


JOGI KONTROLL: *les*

ELLENŐRIZTE:


DR. KOVÁCS GABRIELLA

ALJEGYZŐ 2015. MÁRC. 11.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:


DANÁDA-RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:


SOÓS GYÖRGY


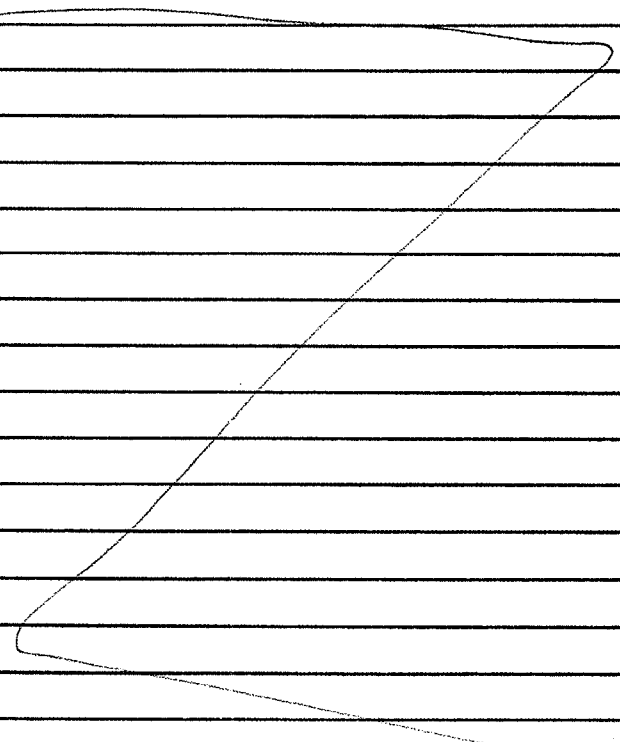
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
ELNÖKE

Az építmény megnevezése: Átfeleltetés
címe: Budapest, Teréz u - Dalg u

Sorszám: L 2765901

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 1

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.08.05 Péntek	Megrendelői és kivitelezői közös bejegyzés
	A mai napon a munkaterületet bejártuk, azt munkavégésre alkalmasnak találtuk. Megrendelő a munkaterületet átadja, Kivitelező átveszi a további megfelelő felújítás előkészítésére.
	Felhívom a Kivitelező figyelmét, hogy a munkafeljegyzést minden érintett rendelkezésére bocsátom! Kérjük meg!
	Munkabeszámoló előtt 2 nappal a Fővárosi Gazdatisztól Dobos Tibor urat felhívni EG.20 7780182
	
	

Az építmény megnevezése:

ü-felújítás

címe:

Tisztes a - Dabj. u.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:

2

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.15 Kétfő	Időjárás: 14, 25, 22 ° Létszám: 5 fő 1 művezető, 4 szem Gép: - Munkavégzés: Tisztes utcába ideiglenes forgalomtechnikai kiépítése //
2016.09.16 Kedd	Időjárás Létszám: 2 fő 1 művezető, 1 gépjármű Gép: 1 FCB Munkavégzés: Anfalthezárólat bontása deponálás //
2016.09.17 Szerda	Időjárás: Létszám: 2 fő 1 művezető, 1 gépjármű Gép: 1 FCB Munkavégzés: Anfalthezárólat bontása deponálás //
2016.09.18 Csütörtök	Időjárás: Létszám: 7 fő 1 művezető, 1 gépjármű, 3 szem, 2 szem Gép: 1 FCB Munkavégzés: Bontott tornász és szállítási terület oldali nagysz. bontása, kiépítése // fűzőanfalts bontása, szállítási // bontott rétegrendjének építése
2016.09.19 Péntek	Munkavégzés nem történt
2016.09.21 Vasárnap	//
2016.09.22 Hétfő	Műszaki Ellenőr bejárása: 1 munkaterületet ellenőrztem: A Tisztes utca pályaszínterületének megerősítést adó fell. réteget, kerékpár a pályaszínterület tér kioldását.

2765903

Sorszám: L

Az építmény megnevezése:

Üdöpiás

címe:

Turkós u. Delej

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:

3

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.22 Kedd	<p>Időjárás: 10, 17, 16°C Naps, borult Légtér: 7 fű, 1 műanyag, 1 gipsz, 3 szm, 2 szm Gép: 1 FCB Munkavégzés: fűtésfal felőli oldalon szegély bontása, újraépítése Azonál munkára emelése Delej utcában fűtésbontású építési munkák</p>
2014.09.23 Kedd	<p>Időjárás: 10, 17, 16°C naps napos Légtér: 7 fű, 1 műanyag, 1 gipsz, 3 szm, 2 szm Gép: 1 Bobcat Munkavégzés: Szegélyek felújítása, Turkós u. Munka szegély építése (Előzetes Szerelés, alap lerakás, betonozás) szegélyre = P CKT talajszívó szifon építése, betonozás Delej u.: Kiemelt szegély bontásának előkészítése. Parkoló autók kimontása, berakás elhelyezése</p>
2014.09.24 Szerda	<p>Időjárás: 9, 20, 16°C Naps Légtér: 6 fű, 1 építési vesetű, 1 Gépkezelő 3 szegélykő, 1 székember. Gép: 1 FCB Munkavégzés: Delej utcában szegélyek bontása, kockakő bontása, szifon elhelyezése.</p>
2014.09.25 Csütörtök	<p>Műszaki Ellenőrzés bejegyzés: 1 munkaterületet ellenőrztem.</p>

2765904

Sorszám: L

Az építmény megnevezése: átépítés
 címe: Budapest Tisztes és Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 4

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.25 Csütörtök	<p>Időjárás: 6, 19, 12 ° Szélhő</p> <p>Létszám: 19 fő: 1 építésszerelő, 2 lépkendő 3 szotember, 3 segédmunkos (teherelő)</p> <p>Munkagépek: 1 JCB, 1 bobcat, 1 teherelő.</p> <p>Munkavégzés: Delej utca épület előli parkoló kockaközbontása kiemelt szegély készítése helyének kitöltés töltése, kiemelt szegély építése, szitálás.</p>
2014.09.26 Péntek	<p>Időjárás: 12, 21, 16 ° Szélhő</p> <p>Létszám: 15 fő: 1 építésszerelő, 1 lépkendő 1 teherelő, 5 szotember, 1 segéd gépek: 1 JCB, 1 bobcat, 1 teherelő.</p> <p>Munkavégzés: Delej utcai kockakö bontása, súlyerővel kiemelt szegély készítése alapozások elkészítése töltése, kiemelt szegély építése, szitálása.</p>
2014.09.27 Szombat	<p>Időjárás: 10, 19, 16 ° Vapora</p> <p>Munkavégzés: mentőként.</p>
2014.09.28 Vasárnap	<p>Munkavégzés: mentőként.</p>

Az építmény megnevezése: Építkezés
 címe: Budapest Timtes és Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 5

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.29 Hétfő	<p>Időjárás: 9, 21, 18 ° Napos Létszám: 13 fő 1 építészvezető 1 Gépkészítő, 1 teherelőző főnök, 5 munkamester, 5 segéd Munkagépek: 1 JCB, 1 bobcat, 1 teherelő. Munkavégzés: Delej utcában kockokó parkoló építése, kiemelt szegély építés, Sőt műlításai, műanyagot szegély építés betonperendállat.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.09.30 Kedd	<p>Időjárás: 11, 22, 20 ° napos Létszám: 13 fő 1 művezető, 1 gépkészítő, 6 szm, 5 szm Munkagépek: 1 Bobcat Munkavégzés: - Delej utcában bobcatos parkoló építéshez folytatás kockokó fűszára. - Timtes utcában öntött aszfalt építés járdaiban</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.10.01 Szerda	<p>Időjárás: 9, 19, 26 ° Napos Létszám: 14 fő 1 építészvezető 1 Gépkészítő, 1 teherelőző főnök, 6 munkamester, 5 segéd Munkagép: 1 JCB, 1 teherelő Munkavégzés: Delej utcában kockokó építése, fűszára.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.10.01 Szerda	<p>Műszaki Ellenőr bejegyzése: 4 munkamestert ellenőriztem.</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Sorszám: L 2765906

Az építmény megnevezése:

címe:

cséplő

Budapest Tiszta és Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

A napló oldalszáma:

1

6

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.02 Csütörtök	<p>Időjárás: 12, 23, 13 °C Napos Létszám: 14 fő, 1 építésvezető, 1 gépkezelő 6 munkember, 6 segédmunkos Munkagép: TFCB Munkarész: - Delej utcában kockakő parkoló építése, függőlése.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.10.03 Péntek	<p>Időjárás: 9, 19, 15 °C felhős Létszám: 15 fő, 1 építésvezető, 1 gépkezelő 1 telerelőző nőfő, 6 munkember, 6 segéd. Munkagépek: 1 bobcat, 1 telerelőző. Munkarész: - Delej utcában kockakő parkoló építése, függőlése, bortott kockakő telepítés, végleges szilítása.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.10.04 Szombat	<p>Időjárás: 6, 18, 14 °C felhős Létszám: 15 fő, 1 építésvezető, 1 gépkezelő 1 telerelőző nőfő, 6 munkember, 6 segéd. Munkagép: 1 bobcat, 1 telerelőző. Munkarész: - Tiszta és Delej utcában ckt Betonozás. - Delej utcában kockakő parkoló építése és függőlése, bortott kockakő telepítés szilítása.</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2019.10.05 vasárnap	Munkaanyagok nem tartózkodnak
2019.10.06 Hétfő	<p>Időpontok: 10, 22, 18^o Napos Letét: 10^o, 1^o gőz, 3 gőz 3 tároló, 5 napos, 1 napos Munkaanyagok: 3 tároló, 1 napos, 1 napos Munkaanyagok: 3 tároló, 1 napos, 1 napos</p>
2019.10.07 kedd	<p>Időpontok: 13, 23, 18^o Napos Letét: 14^o, 1^o gőz, 1^o gőz 1 tároló, 1 napos, 1 napos Munkaanyagok: 1 napos, 1 napos Munkaanyagok: 1 napos, 1 napos</p>
	<p>Időpontok: 13, 23, 18^o Napos Letét: 14^o, 1^o gőz, 1^o gőz 1 tároló, 1 napos, 1 napos Munkaanyagok: 1 napos, 1 napos Munkaanyagok: 1 napos, 1 napos</p>

Sorszám: L2765907

Az építmeny megnevezése: Építési napló
 címe: Budapest, Tátra, Déli oldal
 Követ száma:
 A napló oldalszáma: #

Sorszám: L 2765908

Az építmény megnevezése:

Építési

címe:

Budapest Törles, Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:

8

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.08 Szombat	<p>Időjárás: 12, 21, 19 ° Napos Célzott: 15 fő, építésvezető, gépkész 4 szobrász, 6 segéd. Munkagép: 1 bobcat. Munkavégzés: - Delej utcában kockaköves portkő építése, fuvarozása. // - Törles utcában végleges forgalmtechnikai // építése, ideiglenes forgalmtechnikai átvezetés // Mai nappal a Törles utcai kiviteltől elvárnak.</p>
2014.10.09 Vasárnap	<p>Időjárás: 12, 23, 19 ° Napos. Célzott: 16 fő, építésvezető, gépkész, 6 szobrász, 8 segéd. Munkagép: 1 bobcat. Munkavégzés: - Delej utcában kockaköves portkő építése és fuvarozása.</p>
2014.10.10 Péntek	<p>Időjárás: 12, 22, 20 ° Napos Célzott: 14 fő, építésvezető, gépkész, teherautó sofőr, 6 szobrász, 5 segéd. Munkagép: 1 bobcat, 1 teherautó. Munkavégzés: - Delej utcában kockaköves fuvarozás, szállítás.</p> <p>Hüszari Ellenor bejegyzése: A munkavégzést ellenőriztem.</p>

Az építmény megnevezése: Építési
 címe: Budapest Tiszta Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 9

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.11 Szombat	<p>Időjárás: 12, 22, 20 ° Napos Létszám: 12 fő, építésvezető, 6 szokenbor 1 gépkocsi, 1 teherautó, 3 segéd Munkagép: 1 bobcat, 1 teherautó. Munkavégzés: - Delej utcában kockokó függőszára, munkaterület takarítása, fedlapok szintre helyezése, sít szállítás. fw</p>
2014.10.12 Vasárnap	<p>Munkavégzés nem történt. fw</p>
2014.10.13 Hétfő	<p>Időjárás: 13, 22, 19 ° Napos Létszám: 12 fő, építésvezető, 1 gépkocsi 1 teherautó, 4 szokenbor, 5 segéd Munkagép: 1 bobcat, 1 teherautó. Munkavégzés: - Delej utcában kockokó függőszára sít szállítás fedlapok szintre helye- zése munkaterület takarítása, terep rendezése.</p>
2014.10.13 Hétfő	<p>Műszaki Ellenőr bejövése: Megrendelő a bontott sírszalakura nem tart igényt. A burkolati jeleket a BKK által jóváhagyott forg. tech. tev szerint kell kialakítani, tartós burkolati jellel. Delej u. Gáspár utcához tartó csatlakozásnál a naqkcsaló burkolat szintjét védelemként kell tenni a tervezési szabáson kívül.</p>

P

Az építmény megnevezése: Építési
 címe: Budapest Tisztes, Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ





Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 10

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.14 kedd	Időjárás: 13, 23 21°C Napos Légszám: 8 fő, építésvezető gépkész, (tehertróféjör, 2 székben, 3 segéd. Munkagép: 1 bóbrot, 1 tehertró. Munkavégzés: - Delej utcában kockok-ó sugárána szil szállítás, munkaterület foká- rításra. Tervezi maraton kívül elő csatlakozás a kockok mértékének ellenőrzésére magasságban.
2014.10.15 szombat	Időjárás: 12, 23, 20°C Felhős Létszám: 5 fő: 1 építésvezető, 1 gépkész, 1 tehertróféjör, 2 segédmunkos. Munkagép: 1 bóbrot, 1 tehertró. Munkavégzés: - Delej utcában munkaterület fokarításra szil szállításra lerakó helyre felkiszállítás Barkolom utburkolati jelek festése.
2014.10.16 csütörtök	Időjárás: 10, 22, 19°C Felhős Létszám: 4 fő, 1 építésvezető, 1 gépkész, 1 tehertróféjör, 1 segéd. Munkagép: 1 bóbrot, 1 tehertró. Munkavégzés: - Delej utcában lerakott kockok-ó deponáló helyre szállításra.

Az építmény megnevezése: Építési
 címe: Budapest Tisztes, Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 11

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.17 Péntek	Időjárás: 13, 19, 16°C Észél Célzásim: 1 fő Munkavégzés: Munkaterület takarítása és forgalom átterelés az elkészült részre. ELLENŐRIZTEK 
2014.10.18 Szombat	Időjárás: 17, 22, 20°C Napos Munkavégzés nem történt 
2014.10.19 Vasárnap	Időjárás: 15, 23, 20°C Napos Célzásim: 3 fő, építésvetelő, teleroldó + Gépkészelő. Munkagép: 1 bobcat, teleroldó. Munkavégzés: - Delej utcában a földdeponált szilt elszállításra. 
2014.10.20 Hétfő	Időjárás: 9 Célzásim: 3 fő, építésvetelő, teleroldó + Gépkészelő. Munkagép: 1 bobcat, teleroldó Munkavégzés: - Delej utcában a földdeponált szilt elszállításra. 

Sorszám: L 2765912

Az építmény megnevezése: utépítés
címe: Budapest VIII. ker. Törley utca, Delegátus

ÉPÍTÉSI NAPLÓ




Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 12

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.21 Kedd	Időjárás: 10, 20, 18°C Felhős Vélőszám: 6 fő; repítővesztő, 'Gépkaroló', (teherautóval) Munkagép: 1 teherautó, 1 JCB. Munkavégzés: - Delej utcában régi kőkörfalú Bontás a szűk kiemelés a dugóról Körfal kőkörfal alapozás hegyre állí- tása. M
2014.10.22 Szerda.	Munkavégzés nem történt. M Miszaki Ellenőr bejegyzése: Nagykereskedő birtoklaton a felhívás előzetes lán- teli csomagnak. M
2014.10.23 Csütörtök	Munkavégzés nem történt M

Az építmény megnevezése: Építési
 címe: Budapest Tiszta utca, Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 13

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.24 Péntek	Solárgörös: 8 ° Létszám: 19 fő építésvezető, 3 felhívó, 2 gépkocsizó: 4 szakember, 6 segéd. Munkagép: 2 bobcat, 1 JCB, 3 teherautó, Munkavégzés: - Delej utcában kockakő bontása vályogtársa deponáló helyre szállítása, vályogtársa sínek helyéről való kiemelése. 
2014.10.25 Szombat	Solárgörös: 7 ° Létszám: Munkagép: 1 bobcat 1 teherautó - Delej utcában bontott kockakő deponálóhelyre szállítása, 
2014.10.26 Vasárnap	Solárgörös: 6, 14, 15 ° felhős Létszám: 7 fő építésvezető, 2 munkás 1 gépkocsizó, 1 teherautó sínek, 2 segéd Munkagép: 1 teherautó, 1 JCB. Munkavégzés: - Delej utcában kockakő bontást bontás, deponálóhelyre szállítása. 

Sorszám: L 2765914

Az építmény megnevezése: csépepótlás

címe: Budapest Várker. Törtek, Delegátca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 14

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 10. 27 Hétfő	<p>Szolajörés - 2^o 18, 19^o Napon Létszám: 6 fő, építésvezető, gépkocsifűtő, teherautós, 3 segéd munkos Munkagépek: 1 LC B, 1 teherautó Munkavégzés: Delegátca oldal gáztöltés kövekkel szállítás a deponáló-helyre</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014. 10. 28 kedd	<p>Szolajörés +2^o Létszám: 13 fő, építésvezető, 1 gépkocsifűtő, teherautós, 3 munkos + segéd munkos Munkagépek: 1 Bobcat, 1 teherautó Munkavégzés: - delegátcaiban kiemelt és szüllesztett szegélyek kitöltése alapjainak kiépítése tömörítése ELLENŐRIZTETVE: <i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014. 10. 29 Szerda	<p>Szolajörés: +3, +13 + 10^o Borult idő Létszám: 18 fő, építésvezető, 1 gépkocsifűtő 7 munkos, 8 segéd munkos, 1 teherautós Munkagép, 1 Bobcat, 1 teherautó. Munkavégzés: - delegátcaiban szüllesztett és kiemelt szegély építése és fenyvesítése.</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Az építmény megnevezése:

Építés




címe:

Budapest VIII ker. Tiszaes, Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1

A napló oldalszáma: 15

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 10. 30 csütörtök	<p>Szükséglet: +3, Letételek: 16 fő, építésvezető, gépkocsis 6 szőke ember, 8 reggél Munkagép: 1 bobcat Munkavégzés: - Delej utcában, ainek domboldalára 5m domboldalra, kiemelt szűk hely építés fugázás, kontolt kockakő deponálóhely szállítás ELLENŐRIZTEM. </p>
2014. 10. 31 Péntek	<p>Szükséglet: +2 ó Letételek: 16 fő, építésvezető + Gépkocsis 1 teherviszor, 5 szőke ember, 8 reggél. Munkagép: 1 bobcat, teherviszor Munkavégzés: Delej utcában kontolt kockakő deponáló hely szállítás, kockakő padló alá betonozás, kockakő építése fugázása, ainek elszállítás szűk hely építése. Vízvezető műveletének, befejezése. </p>
2014. 11. 01 Szombat	<p>Munkavégzés nem történt </p>

Az építmény megnevezése: átépítés
 címe: Budapest VIII ker. Tiszaes, Delej utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 16

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.11.02 Vasárnap	Munkaüregész nem történt. M
2014.11.03 Hétfő	Időjárás: +3 + 10 + 8°C Borult Létszám: 15 fő, építésvezető, 1 Gépkész 5 szobában 8 reggel Munkagép: 1 bobcet Munkavégzés: - Delej utcában utasban a + új az elkészítése fémörmölés, karkok építése és függőzése. Tavaszi területen kívül az orralon maestrosi munkavégzés új épített magarágkor M
2014.11.04 kedd	Időjárás: +4 + 12, + 9°C Hóos Létszám: 10 fő, építésvezető, 5 szobában 4 reggel Munkagép: 1 bobcet Munkavégzés: - Delej utcában karkok építése és függőzése horgolt karkok deponálás helyreállítás CVT réteg betonozás elvégzése utpályában betonozás, utatörés Tavaszi területen kívül az orralon maestrosi munkavégzés új épített magarágkor. Hűtési Ellenőr: Vízvezetést biztosítani kell a meglévő vízvezeték irányába. M

Az építmény megnevezése: Állépkút

címe: Budapest VIII ker. Török u. Deák u.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 17

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 11. 05 Szerda	<p>Időjárás: 8, 17, 16°C Légnem: 10% párhuzamos, 1 gőz, 4 mm, 4 mm Gépek: 1 Bobcat Munkavégzés: utópályában CHT réteg készítéséhez felületára, tömörítése, utószárazítás Parafában csatornák építés befejezése, lejárattal rendelkező terület megsejtesztése, terület felületkezelés Csirta sőt leporozása.</p>
2014. 11. 06 Csütörtök	<p>Időjárás: 8, 15, 12°C Légnem: 6% párhuzamos, 1 gőz, 2 mm, 2 mm Gépek: 1 Bobcat Munkavégzés: utópályában CHT réteg készítéséhez befejezése, tömörítése, CHT utószárazítás Terület szanitálás felületára, sőt elmulasztása</p> <p>ELLEJÖRTEN:</p>
2014. 11. 07 -2014. 11. 15 szombat	<p>Terület öntése. CHT utószárazítás Egész munkavégzés nem történt</p>
2014. 11. 16 Vasárnap	<p>Időjárás: 5, 12, 10°C napos Légnem: 5% párhuzamos, 4 mm Gépek: - Munkavégzés: Parafában sőt terület sőt</p>
2014. 11. 17 Hétfő + 2014.	<p>Munkavégzés nem történt</p>
2014. 11. 18	<p>Műszaki Ellenőrzés befejezése. Az aszfaltozás munkabiztonság- engedélyét megkapom.</p>

Az építmény megnevezése:

Újépítés

címe:

Déli u - Török u

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:

18

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2016. 11. 18 Kedd	<p>Időjárás: 8, 14, 12 felhős Munkaanyagok (beton): 15 fő, 1 művelet, 4 gépkezelő, 5 mm, 5 mm Gépek: 1 furka, 2 állvány, kerti és ábrázó gép Munkaterrén: Déli utcában útpályában ábrázolás Kiszállítás, 2 rétegben aszfalt elterítés, Kiszállítás, aszfaltkezelés kiértékelése. // Ellenőrzés. <i>[Signature]</i></p>
2016. 11. 19 Szerda	<p>Időjárás: 5, 12, 8 % felhős Munkaanyagok (beton): 5 fő, 1 művelet, 4 mm Gépek: - Munkaterrén: Déli utcában, munkaterrén és aszfalt, gépek elhárítása Kiszállítás munkaterrén elhárítása Terület feljes felmérése //</p>
2016. 11. 20 Csütörtök	<p>Időjárás: 6, 12, 8 % napos Munkaanyagok (beton): 6 fő, 1 művelet, 3 mm Gépek: 1 gépkocsis Munkaterrén: Déli utcában ideiglenes forgalomtechnikai berendezés. Végleges forgalomtechnikai berendezés. Tábla elhelyezése, feljes felmérése //</p>
2016. 11. 20 Csütörtök	<p>Munkaterrén bejegyzés: A mai nappal a munkát elvégeztem A területen további munkavégzés nem történik //</p>

Sorszám: L 2765919

Az építmény megnevezése:

Állásító
címe: *Budapest VIII. ker. Tenkes u. Dóka u.*

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:

19

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.11.27	<p>A mai napon a műszaki átadás-átvétel megtörtént felvett egyprotokoll szerint. Az építési naplót mai nappal lezárom. A napló L2765901-L2765919 sorszáma oldalainak 1 példányát megrendelő^ü átvette. <i>[Signature]</i></p>

Sorszám: L 2765876

Az építmény megnevezése:

Építéskorrekció

címe:

Budapest, Alföldi u - Sárkány u


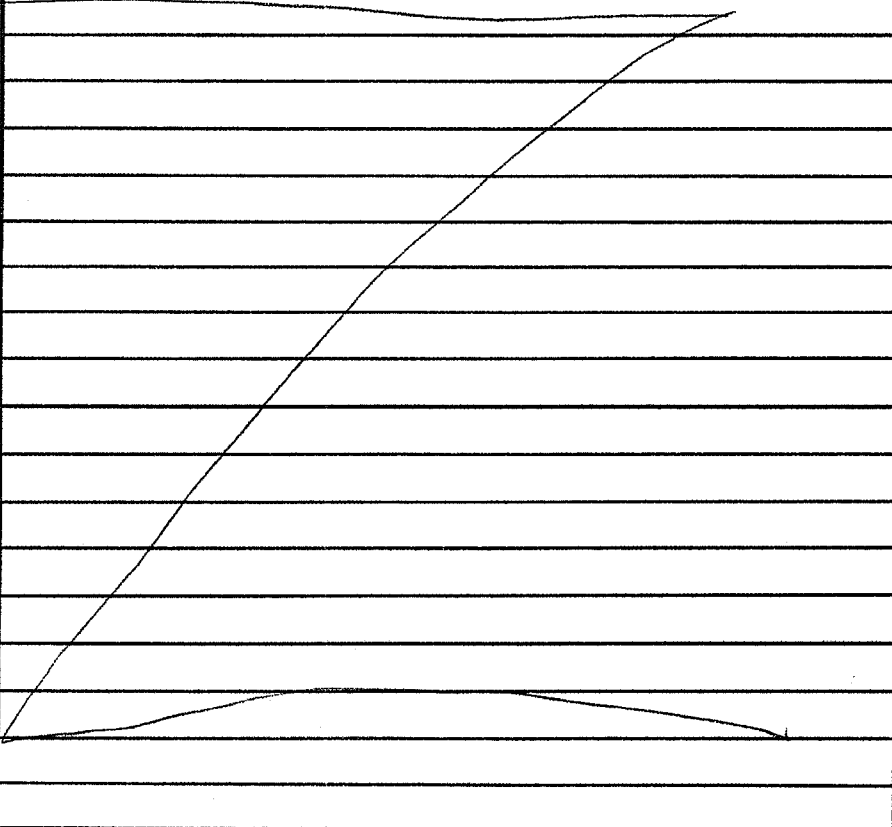
ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:

1





Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2016. 09. 04 Csütörtök	Megrendelői és kivitelezői közös bejegyzés
	A mai napon a munkatervet bejártuk, azt munkavégésre alkalmasnak találtuk.
	Megrendelő a munkatervet átadja, kivitelező átveszi a tervet a megfelelő felújítás elvégzésére.
	FELHÍVOM A KIVITELEZŐ FIZETÉSÉT, JELET A SZÁMLÁZÁST MINDEN ÉRTÉKTELJELŐVÉSELÉSEK KÉRÉS MÉG.
	MUNKAKÖZDÉS ÉRTÉKTELJELŐVÉSELÉSEK 2 NAPPA A FŐ- VÁROSI GAZDASÁGSZOLGÁLTATÁSOK DOKTOR TIBOR UNAT t: 06 20 778 0182 TELJEL.
	
	

Sorszám: L 2765877

Az építmény megnevezése: Új felújítás
 címe: Budapest, Alföldi u - Sárkány u

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 2

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.08 Hétfő	Idejénél: 15, 23, 20 Létrám: 8 fű 1 művelet, 1 gipsz, 3 mm, 3 mm Gipsz: 1 Care, 1 FCB Munkavégzés: Alföldi u. Wepribaz u - Kun u közötti madarcsin eddiges foglalkozásainak lezárása Terület szétbontása. Munkaterületre felvonulás, inodakantárok felmérése azonnal. Két oldali tartóba arfakt végezésa megdőlés 30cm se. Arfakt bontása konténerbe rakása Két oldali nagy bontása lórófejjel. 
2014.09.09 Kedd	Idejénél: 14, 28, 24 ° Létrám: 8 fű 1 művelet, 1 gipsz, 3 mm, 3 mm Gipsz: 1 Care, 1 FCB Munkavégzés: Páros oldalon barakk kődarab bontása, válogatása. 
2014.09.10 Szerda	Idejénél: 14, 27, 22 ° Létrám: 8 fű 1 művelet, 1 gipsz, 3 mm, 3 mm Gipsz: 1 Care, 1 FCB Munkavégzés: Páros ^{oldalon} alap kődarab, dekonálás Szegélyek kőnézése. Barakk kődarab és itt műveletekkel folytatódás, elrendezés. 
2014.09.10 Szerda	Műszaki Ellenőrzés bejegyzése: Követi T. Vállalkozót, hogy a munkák átadásáról a lakókat tájékoztatása. 

Sorszám: L 2765878

Az építmény megnevezése:

Csúszkőház

címe:

Budapest, Hűföldi a - Sárosgy u

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1

A napló oldalszáma: 3




Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2016.09.11 Csúszkőház	<p>Időjárás: 14, 23, 15 °C</p> <p>Célnyom: 12 fő 1 műveleti, 2 gépjáró, 4 szm, 5 szm</p> <p>Gépjáró: 1 case, 1 FCB</p> <p>Munkavégzés:</p> <p>Szelektív szűrt, cement kitérése</p> <p>Kiemelt és szűrtelt negatív beépítés,</p> <p>Beton gázdáig. Beton, mérföldmóddal</p>
2016.09.12 Péntek	<p>ESŐS nap</p> <p>Munkavégzés nem történt</p>
2016.09.13 Szombat	<p>Időjárás: 14, 23, 18 °C záporoz</p> <p>Célnyom: 8 1 műveleti, 1 gépjáró, 3 szm, 3 szm</p> <p>Gépjáró: 1 FCB, 1 case</p> <p>Munkavégzés:</p> <p>Kiemelt negatív fugázása</p> <p>Szelektív mellett: 1 szm 30 darab rúdada betona</p> <p>Köcsökös rúdada ezáltal ágyazta</p>
2016.09.14 Vasárnap	<p>Munkanélküli nap</p> <p>Munkavégzés nem történt</p>
2016.09.15 Hétfő	<p>Időjárás: 15, 23</p> <p>Célnyom: 16 fő 1 műveleti, 2 gépjáró, 6 szm, 5 szm</p> <p>Gépjáró: 1 Bobcat, 1 FCB</p> <p>Munkavégzés:</p> <p>Pályá oldali partalában köcsökös felületet folytatása.</p> <p>Műszaki ellenőrzés bejepte.</p> <p>A munkaterületet ellenőrztem.</p>

Sorszám: L 2765879

Az építmény megnevezése: Új felújítás
 címe: Budapest, Alföldi új, Sósrahy u.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 4

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.16 Kedd	Időjárás: 15, 22, 18°C felhős Célzám: 8 fő munkorosi, 1 gépkocsi, 3 szem, 3 szem Gépek: 1 Bobcat, 1 SCR. Munkavégzés: Kun u. földi páros oldalon kockaköb parkoló építésének felújítása Páros oldalon Kun utcai ivócsap helyén bentlő, új építése. Aszfalt burkolat bentlővel. Munkavégzés betanulás 
2014.09.17 Szerda	Időjárás: 16, 21, 19°C Napos Célzám: 16 fő 1 építésvezető 1 gépkocsi 8 szeged. 6 szokember Gépek: 1 Bobcat, 1 JSB, 1 teherautó Munkavégzés: Páros oldalon kockaköb parkoló építése és felszerelése, kockaköb közötti aszfalt alapjainak kiújítása talaj tömörítésre és betanulás Páros oldalon kockaköb bentlő. 
2014.09.18 Csütörtök	Időjárás: 14, 20, 17°C NAPOS Célzám: 16 fő, 1 építésvezető, 1 gépkocsi 1 teherautó, 7 szokember, 6 szeged. Gépek: JSB, Bobcat, Teherautó Munkavégzés: Páros oldalon kockaköb Parkoló építése és felszerelése, Sítv. felszerelése, Páros oldalon kockaköb kockaköb parkoló bentlő. 

Az építmény megnevezése: utfelújítás
 címe: Budapest, Alföldi ut, Sarkány c.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ





Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 5

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.19 Péntek	<p>Időjárás: 14, 19, 16 °C Felhős Célszám: 13 fő, 1 építésvezető, 1 gépkocsi 1 teherautószifon, 4 szokember, 6 szegély. Gépek: 1 db JCB, 1 bobcot, 1 teherautó. Munkarész: páros oldalon lerakott kockakő fugázása, páros oldalon kockakő bontása és kiemelt szegély kitűzése.</p> <p><i>[Signature]</i> Ellenőrztem: <i>[Signature]</i></p>
2014.09.20 Szombat	<p>Időjárás: 15, 22, 19 °C Napos Célszám: 18 fő, 1 építésvezető, 1 gépkocsi 2 teherautószifon, 7 szokember, 7 szegély. Gépek: 1 JCB, 1 bobcot, 2 teherautó. Munkarész: Alföldi utca páros oldalon a parkoló szifonját szegély kitűzése, a kiemelt és a szifonozott szegély építése fugázása a Páros oldalon parkoló kockakő fugázása sít szállítás a deponiába.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.09.21 Vasárnap	<p>Időjárás: 14, 20, 18 °C Napos Célszám: 1 fő szegélymunkás Munkarész: Beton lecsapolás.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
2014.09.22 Hétfő	<p>Időjárás: 13, 21, 16 °C Napos Célszám: 18 fő, 1 építésvezető, 1 gépkocsi, 1 teherautószifon, 7 szokember, 8 szegély. Gépek: 1 JCB, 1 bobcot, 1 teherautó. Munkarész: Alföldi utca páros oldalon kockakő parkoló építése, fugázása, kockakő bontása, szegélyek fugázása.</p> <p><i>[Signature]</i></p>

Az építmény megnevezése: Utfelújítás
 címe: Budapest, Alföldi ut Sárkány u.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 6

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.23 kedd	Időjárás: 9, 16, 13 ° Napos Létszám: 12 fő, 1 építésvezető, 1 Gépkész 5 munkamester, 1 teherelőző, 4 segéd Munkagépek: 1 JCB, 1 bobcat, 1 teherelő. Munkarészek: Alföldi utca pordolon oldalon kockoká parkoló építése és fugázása, Sittszállító, utastben kockokó bontása 
2014.09.24 szerda	Időjárás: 5, 20, 16 ° Napos Létszám: 15 fő, 1 építésvezető, 2 Gépkész 1 teherelőző, 6 munkamester, 5 segéd Gépek: 2 db bobcat, 1 teherelő, 1 betonerő. Munkarészek: kockoká parkoló építése, fugázása utast olajonok elkészítése és tömörítése, CKT betonozása, tömörítése, Kun utca Alföldi utca ivalt szállítás segéd építése. 
2014.09.25 csütörtök	Időjárás: 6, 19, 12 ° Felhős Létszám: 15 fő: 1 építésvezető, 1 Gépkész 1 teherelőző, 6 munkamester, 6 segéd. Munkagépek: 1 bobcat, 1 teherelő, 1 betonerő. Munkarészek: Alföldi utca oldalon kockoká parkoló fugázása, kockokó bontása az utast oldalon, siltszállító, utastben CKT Betonozása és tömörítése, loccolás.  Mészárosi Ellenőr bejegyzése, munkamesterrel ellenőrzés. 

Az építmény megnevezése: Utfelújítás
 címe: Budapest Alföldi Sorkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ




Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 1

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.26 Péntek	Időjárás: 19, 21, 16 ° felhős Létszám: 6 fő, 1 építésvezető, 1 tehergépjármű 2 szkenber, 1 csipkéselő, 1 segéd. Gépek: 1 tehergépjármű, 1 bobcat. Munkavégzés: Alföldi utca pórázoldalon vizsgálat befejezése munkaterület fokoztatás, sztrábolítás utolsó szintjére történő, aszfalt öblök morósa.
2014.09.27 Szombat	Időjárás: 10, 19, 16. Napos Létszám: 12 fő, 1 építésvezető, csipkéselő 1 tehergépjármű, 4 szkenber, 5 segéd. Gépek: 1 JCB, 1 tehergépjármű, 1 bobcat. Munkavégzés: Alföldi utcában aszfalt öblök morósa, kockaköb bordúra pályaszalag szegély építése, sztrábolítás.
2014.09.28 Vasárnap	Időjárás: 9, 18, 17 ° Munkavégzés mentőként.
2014.09.29 Hétfő	Műszaki Ellenőrzés befejezése: A fűtővezeték a közművel kapcsolatos műveléssel kell kiemelkedni. A fűtővezeték kiemelt szegélyvel kell lenni.

Az építmény megnevezése: Értelmezítés
 címe: Budapest Alföldi utca, Sónkó utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 8

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.09.29 Hétfő	Időjárás: 9, 21, 18 °C Napos Létstám: 14 fő, 1 építésvető, 1 teherelő- rőfő, 1 gépkaroló, 5 munkos, 6 segéd. Munkagépek: 1 bobcat, 1 teherelő, Munkaterület: Alföldi utcában víznyelők és kotorna fedlapok szintre helyezése, foverem szegélyezése és kőharkóparkoló fugázása. 
2014.09.30 Kedd	Időjárás: 11, 22, 20 °C Napos Létstám: 14 fő, 1 építésvető, 1 gépkar- (teherelő)rőfő, 5 munkos, 6 segéd. Munkagépek: 1 JCB, 1 Bobcat, 1 teherelő. Munkaterület: Alföldi utcában osztott utpólya alatt: EKI építése tömörítés, víznyelőknek szintre helyezése kotorna fedlapok szintre helyezése, kőharkóparkoló fugázása. 
2014.10.01 Szerda	Időjárás: 10, 24, 18 °C Napos Létstám: 16 fő, 1 építésvető, 1 gépkaroló 1 teherelő-rőfő, 6 munkos, 7 segéd. Munkagép: 1 teherelő, 1 bobcat, 1 JCB. Munkaterület: - Alföldi utcában foverem szintre Munkaterület takarítása, bordott kőharkó- depóhelyezése szállítás, utpólya EKI- zása, fa ültetése. 

Az építmény megnevezése: átépítés
 címe: Budapest Alföldi, Sörköny utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 9

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.02 szombat	Időjárás: 9. 21, 18°C Napos Létszám: 1 fő, építésvezető 2 gépkocsi 2 teherautó sofőr, 6 szokember, 1 segéd Munkagép: 1 ZCB, 1 bobcot, 2 teherautó. Munkavégzés: - Sörköny utcában kiemelt szegély bontása, teherautó rakósa depóhelyre szállítása. Alföldi utcában bontott kockoká depóhelyre szállítása, foverem szegélyezésre és illesztésre, utpályacská betonozása, tömörítése. Ellenőrztem: <i>[Signature]</i>
2014.10.03 péntek	Időjárás: 7. 18, 15, 5°C felhős Létszám: 18 fő, építésvezető, 3 gépkocsi 2 teherautó sofőr, 1 szokember, 5 segéd Munkagép: 1 ZCB, 2 Bobcot, 2 teherautó. Munkavégzés: Alföldi utcában kockotö bontása, utpályacská készítése, tömörítése, - Sörköny utcában párhuzamos oldalon kiemelt szegély építése, járda betonozása. <i>[Signature]</i>
2014.10.04 szombat	Időjárás: 6-18, 16°C felhős Létszám: 16 fő, építésvezető, 2 teherautó- sofőr, 2 lépkészítő, 8 szokember, 3 segéd Munkagép: 1 ZCB, 1 bobcot, 2 teherautó. Munkavégzés: - Alföldi utcában ölköltözés a Kun utca és a Rényi szokozára,

Az építmény megnevezése:

útépítés

címe:

Budapest Alföldi Sorköny utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma:

1

A napló oldalszáma:



10

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 10. 04 szombat	<p>Alföldi első szakaszonál fedlapok szintrehozása és bontott kockok deponáló-helyre szállításai.</p> <p>- Sorköny utcában pároltor adóba kiemelt szegély építése, fugázása, földön betonozása.</p> <p>fm</p>
2014. 10. 05 vasárnap	<p>Munkavégzés nem történt</p> <p>fm</p>
2014. 10. 06 hétfő	<p>Időjárás: 11, 22, 18 °C Napos Célszám: 18 fő, 1 építésvezető, 3 gépkocsi 3 teherautó - pólya, 6 szakember 5 szegél Munkagép: 1 finiszer, 1 JCB, 1 bobcat 3 teherautó.</p> <p>Munkavégzés: - Alföldi utcában utpályán aszfaltozás, második item kockok bontása, és deponáló-helyre szállításai, munká- terület fokoztatása.</p> <p>fm Ellenőrztem [signature]</p>
2014. 10. 07 kedd	<p>Időjárás: 10, 20, 17 °C Napos Célszám: 14 fő, 1 építésvezető, 1 gépkocsi 3 teherautó - pólya, 5 szakember, 5 szegél. Munkagép: 1 bobcat, 1 JCB, 2 teherautó Munkavégzés: - Alföldi utcában a kiemelt szegély helyének kitakarítása, szegély</p>

Az építmény megnevezése: Értékpótlás
 címe: Budapest Alföldi Sorkönyv utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 12

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
	kikészítésre közkövi portoló lapokat elkészítik és intőmóritése, a munkálati jelek feltűsítésre az oszlopra 
2014. 10. 08 Szerda	Súlyjárás: 9, 19, 17 ° felhős Látás: 16 fő építésvető, 2 gépkaró 2 tehervelő, 5 szokember, 6 segéd Munkagép: 1 JCB, 1 bobcat, 2 tehervelő Munkavégzés: - Sorkönyv utcában páros oldalon kiemelt szegély helyének bontása, utólag közkövi bontása. - Alföldi utcában kiemelt szegélyt szegély építése, sugózása, bontott közkövi depóhelyre szőlítés. MUNKÁI ELŐL BEFEJTÉSE. MUNKÁI ELŐL BEFEJTÉSE AZ ÉPÍTÉS ALATT IS RÉGOSITÁSI KÉRT A LAKOSSÁGI FORGALMAT ÉRINT TERTŐL ELTEREDEN CIO REZON ALAP ÉPÍTÉSET KÉRTEM A SARLANY U. ÉS ALFÖLDI U. 14-20 SZ. KÖZÖTT
2014. 10. 09 Péntek	Súlyjárás: 10, 22, 18 ° Napos Látás: 16 fő építésvető, 2 tehervelő 2 gépkaró, 6 szokember, 5 segéd Munkagép: 1 JCB, 1 bobcat, 2 tehervelő Munkavégzés: - Sorkönyv utcában közkövi bontása, depóhelyre szőlítés. - Alföldi utcában kiemelt szegélyt szegély építése, sugózása, páros oldalon közkövi munkára, bontott közkövi depóhelyre szőlítés, szit szőlítés. 

P

Az építmény megnevezése: utépítés Sorszám: L 2765887
 címe: Budapest Alföldi Sörkönyv utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 12

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.10 Péntek	Súlyjárás: 11, 23, 20 ° Napos Létszám: 16 fő, 1 építésvezető, 1 gépkocsi 1 teherautó előző, 6370 kember, 7 segéd. Munkagép: 1 bobcat, 1 teherautó. Munkavégzés: - Alföldi utcában kockaközpontok építése, sugározás nélkül szegély építése az alap ösörszámításával, betonozás betonozás tömörítéssel. fu
2014.10.11 Szombat	Súlyjárás: 12, 22, 20 ° Napos. Létszám: 20 fő, 1 építésvezető, 2 teherautó, 2 gépkocsi, 8 kember, 7 segéd. Munkagép: 1 JCB, 1 bobcat, 2 teherautó. Munkavégzés: - Alföldi utcában kockaközpontok betonozás betonozás tömörítéssel nélkül - Sörkönyv utcában kiemelt szegélyek építése. fu
2014.10.12 Vasárnap	Munkavégzés nem történt. fu
2014.10.13 Hétfő	Mészárosi Ellenőr bejegyzése: Sörkönyv utcában kiemelt szegély szintjét kérem a partikuláris projektben megvalósuló párdar építészeti terv alapján megépíteni. fu

Az építmény megnevezése: Építési
 címe: Budapest Alföldi Sárkányudva

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 13

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.13 Hétfő	Időjárás: 12, 13, 20 °C Napos Létszám: 1 fő, 1 építésszerelő, 2 gépkocsi 2 teherautó sofőr, 6 munkember, 1 segéd. Munkagép: 1 bobcat, 1 JCB, 2 teherautó. Munkavégzés: - Alföldi utcában kockaköves parkoló fugósára betonozás betonozás és tömörítés. - Sárkány utcában kiemelt és rüllesztett szegélyek kitúzása, beépítése. MN
2014.10.14 Kedd	Időjárás: 14, 23, 21 °C Napos Létszám: 1 fő, 1 építésszerelő, 1 teherautó sofőr, 1 gépkocsi, 6 munkember, 10 segéd. Munkagép: 1 bobcat, 1 JCB, 1 teherautó Munkavégzés: - Alföldi utcában a kockaköves fugós, munkaterület fokozatos, régi kiemelt szegélyek bontása, kockaköves bontás és szőlítés. - Sárkány utcában kiemelt és rüllesztett szegély kitúzása, kirosása, szegélyek beépítése és fugósítása. MN
2014.10.15 Szerda	Időjárás: 9, 18, 17 °C Felhős Létszám: 2 fő, 1 építésszerelő, 2 teherautó 12 munkember, 2 gépkocsi, 11 segéd. Munkagép: 2 bobcat, 1 JCB, 2 teherautó. Munkavégzés: - Deley utcában kockaköves bontás és deponálókahélyre szőlítés, szegélyek kitúzása. - Sárkány utcában szegélyek fugósítása, kockaköves parkoló építése, kiemelt és rüllesztett szegélyek

Sorszám: L 2765889

Az építmény megnevezése: utépítéscíme: Budapest Alföldi, Sárkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 14



Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.15 Szombat	kifűsítés és beépítés a járda közé betonozása, réteg módosítása. M
2014.10.16 csütörtök	Időjárás: 10, 22, 19 °C Felhős Létszám: 19 fő, 1 építésszerelő, 2 gépkocsis 1 teherautósőfő. Munkagép: 1 FCB, 1 bobcat, 1 teherautó. Munkavégzés: - Alföldi utcában betonszegélyek felszerelése, kockakő parkoló építése, bontott kockakő deponálóhelyre szállítása, régi szegély- nyak és kockakő bontása. - Sárkány utcában járda betonozás, kockakő parkoló építése, régi kockakő réteget bontása, fagyveszték készítése kiemelt beton szegélyből, víznyelő nyílás szintre helyezésére. - Alföldi utcában víznyelő nyílás beállítása, M
2014.10.17 Péntek	Időjárás: 13, 18, 16 °C Észős Létszám: 19 fő, 1 építésszerelő, 2 gépkocsis 1 teherautósőfő, 6 szakszemély, 3 segéd. Munkagép: 2 bobcat, 1 FCB, 1 teherautó, Munkavégzés: - Sárkány utcában kockakő parkoló építése, rétegen lévő kockakő bontása, fagyveszték építése kiemelt szegélyből, víznyelő szintre helyezésére.

Sorszám: L 2765890

Az építmény megnevezése: Értékpapír
 címe: Budapest Alföldi Sorkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 15

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.17 Péntek	- Alföldi utcában kockakő portoló építése fugázása, kiemelt szegély kitű- zése beépítése, 18-18 mm előtti szokvány lesovánóra forogdon elől, a forgalmat az Alföldi két végénél lehet megkerülni. 
2014.10.18 Szombat	Időjárás: 11°C 22, 20°C Napos Létszám: 26 fő, 1 építész, 4 gépkocsis, 10 szék, 10 széken, 10 szék Munkagép: 2 bobcat (teherelő), 1 betonkora, 1 JCB. Munkavégzés: - Alföldi utcában kockakő építése, fugázása, kockakő utpálya bontása, kiemelt szegély építése és fugázása. - Sorkány utcában kockakő portolót építése régi utpálya kockakő bontása, bontott kockakő deponáló helyre hozása. 
2014.10.19 Vasárnap	Időjárás: 13°C Létszám: 8 fő, 1 építész, 1 gépkocsis, 2 szék, 4 szék Munkagép: 1 JCB, 1 bobcat. Munkavégzés - Alföldi utcában kockakő építése, régi portoló bontása, kiemelt szegélyek bontása, utpályában lévő kockakő bontása, vizsgáló méter helyezése - Sorkány utcában munkavégzés 1 méterig.

Az építmény megnevezése: citépítés
 címe: Budapest Alföldi, Sárkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 4 A napló oldalszáma: 16

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2014.10.20 Hétfő</p>	<p>Szolajörön: 9^o Célidőszám: 22 fő, építésvető 3 gétkelő 2 tehervelő szifón, parkokban, 8 szegő Runkagép: 1 JSB, 2 bobcot, 2 tehervelő Runkarészes: - Alföldi utcában régi utpályakockokó bontása, deponáló helyre szállítása, kockokó parkoló beépítése, - Sárkány utcában kockokó parkoló rakósa kitépésében kockokó bontás, deponáló helyre szállítása.</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>2014.10.21 Kedd</p>	<p>Szolajörön: 10, 20, 18^o Felhős Célidőszám: 13 fő, építésvető 2 gétkelő 2 tehervelő szifón, 4 parkóban, 10 szegő. Runkagép: 2 bobcot, 1 tehervelő, 1 cithenge Runkarészes: - Alföldi utcában kiemel, zúrtított szegőlyek kitűzése, alapjainak elkészítése tömörítéssel szegőlyek szegőlyek beépítése betonozással. - Sárkány utcában utpályarészek elkészítése tömörítéssel, vítt elvezetés.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MŰSZAKI ELLELŐP BEJEGYZÉSE: AZ ALFÖLDI UTCÁBAN A KAPURELÉPŐK BURKOLTA A MEGLÉVŐ KÜLÖTTEL MARR, DÖNTÖTT SZEGŐLY LEZÁRÁSSAL.</p> <p><i>[Signature]</i></p>




Sorszám: L 2765892

Az építmény megnevezése: utépítés

címe: Budapest Alföldi Sörkamara

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 17

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.22 szombat	Időjárás: 7, 16, 12 ° És Eső, erd. Munkavégzés nem történt. 
2014.10.23 csütörtök	Munkavégzés nem történt 
2014.10.24 Péntek	Időjárás: 7 ° 13, 11 ° Ész Levegő: 18 °, építésvető, 23 ° 2 telerőzfűző, 6 szekerber, 1 szegél. Munka: 2 bobcs, 2 telerő Munkavégzés: - Alföldi utcában - 14-15 méterrel töréshez azonos lejárókapu előtti szegély építése miatt teljes lerész bunkók közköb bontása utpója szekeret bontása döntött szegély beépítése betonozás betonozás tömörítéssel a közterület fentebb köpű bedol lerészése, a szegélyek bontása közköb bontása, döntött szegély beépítése, betonozás betonozás és tömörítés. ELLEHÁRÍTÁS. 

Sorszám: L 2765893

Az építmény megnevezése: utáépítés
 címe: Budapest Alföldi Sorkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 18

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.10.25 szombat	<p>Selídülés: 7.° létszám: 22 fő építésvezető, 3 teherorvosi 2 gépkocsió 8 munkember 8 segéd. Munkagép: 1 FCB, 2 bobcat, 3 teherorv. Munkavégzés: - Sorkány utcában kockokö fugózása, utpólya olépitmény tömörítése, utpólya betonozás tömörítéssel pl. mozdulópók szintre helyezésére - Alföldi utcában 16-03 km elotti kop utpólya lerakása elvégzett szegély építése mint döntött szegély beépítése fugózása, a 3 km elotti döntött szegély beépítése fugózása utpólya olépitmény tömörítése, utpólya betonozás tömörítéssel, hu</p>
2014.10.26 vasárnap	<p>Selídülés: 6, 17, 15° felhős létszám: 19 fő építésvezető, 1 teherorvosi 2 gépkocsió 9 munkember, 10 segéd. Munkagép: 1 db FCB, 2 bobcat, 1 teherorv. Munkavégzés: - Alföldi utcában kockokö parkoló építése szegélyek fugózása utpólya kockokö bontása, depozitáló helyek mobilizáció, aszfalt utpólya ó. p készítése tömörítéssel. - Sorkány utcában kockokö rakás, fugózása. hu</p>

Az építmény megnevezése: Utépítés
 címe: Budapest Várkerület Alföldi, Sárkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 19



Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2014. 10. 27 Kétfő</p>	<p>Időjárás: 8 °C Utépítés: 18 fő, ipítővesető 2 gépkezelő 2 tehertároló, 7 munkanap, 6 reggel Munkagépek: 1 bobcat, 1 tehertároló Munkarészek: - Alföldi utcában kockakö sugározás, sít szállítás. - Sárkány utcában kockakö rakás sugározás, utolsó kiemelés tömörítése, 6 betonozás tömörítéssel.</p>
<p>2014. 10. 28 kedd</p>	<p>Időjárás: +2 °C Utépítés: 19 fő, ipítővesető, 2 tehertároló, 2 gépkezelő, 5 munkanap, 9 reggel Munkagépek: 2 tehertároló, 2 bobcat, 1 betonozó Munkarészek: - Alföldi utcában kockakö sugározás sít szállítás, betonozás, tömörítéssel - Sárkány utcában 6 betonozás tömörítéssel.</p> <p>Műszaki Ellenőrzés bejegyzése: Az Alföldi u. építési utcarépa önállóan kérem a párhuzamos oldalon kiemelés megkezdését és tudják eltávolítását Megrendelő kérem.</p>

P

Az építmény megnevezése: otépítés
 címe: Budapest VIII ker Alföldi Sörkőny utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 20

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2014.10.29 szombat</p>	<p>Időjárás: +3 + 14 + 10 °C Borult idő létesítmény: 17 fő: létesítményesítő, gépkocsizó, teherautós főnök, 2 szobakémben, 3 szegedt munkogép, 2 teherautó, 1 bóbcsot. Munkavégzés: Alföldi utcában kockokó kerítésre deponálók helyre szállítása, szegélyek melletti üntött aszfalt járda javítása c.k. betonon. 2 db faló bontása elvégzése Fűtőrendszer felújítása bontott szobák térfalakkal, újabb építés. Fűtőrendszer tenné köldök</p>
<p>2014.10.30 vasárnap</p>	<p>Időjárás: +3 létesítmény: 17 fő, létesítményesítő, gépkocsizó, teherautós főnök, 2 szobakémben, 1 szegedt munkogép, 2 teherautó, 1 bóbcsot. Munkavégzés: - Alföldi utcában bontott kockokó, deponálók helyre szállítása, szegélyek és kiemelt szegélyek kifizése alapjainak elkészítése és beépítése, Ellenőrzés tenné:  </p>

Sorszám: L 2765896

Az építmény megnevezése: Építési

címe: Budapest VII. ker. Alföldi, Sainkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ


Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 27

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
<p>2014.10.31 Péntek</p>	<p>Időjárás: +2°C Létszám: 19 fő, 1 építésszerelő, 1 cépkészítő 1 telerakó, 1 főnök, 1 segéd Munkagép: 1 JCB, 1 bobcat, 1 teherautó Munkavégzés: - Sainkány utcában 6 db vízvezeték elfektetés, termélföldelés, munkaterület takarítása. - Alföldi utcában régi kockakő bontása, depóniá helyreállítás, kockakő parkoló betonozása, kockakő építés, kiemelt és szilvesztelt szegélyek kitérítés alapjának elkészítése tömörítéssel, szegélyek beépítése betonozásba.</p>
<p>2014.11.01 Szombat</p>	<p>Munkavégzés nem történt</p>
<p>2014.11.02 Vasárnap</p>	<p>Időjárás: +5°C +9°C Borult idő Létszám: 19 fő, 1 építésszerelő, 1 cépkészítő, 1 telerakó, 1 főnök, 1 segéd. Munkagép: 1 bobcat, 1 teherautó Munkavégzés: - Alföldi utcában parkoló betonozás, kockakő rakása, utcában lévő kockakő bontása, depóniá helyre állítása.</p>

Az építmény megnevezése: Építésicíme: Budapest VIII ker Alföldi, Sarkány utca

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 22

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 11. 03 Hétfő	<p>Időjárás: +3 +12 +9°C Borult</p> <p>Értékm: 16 fő: 1 építési vezető, 16 ipkerelő, 2 teherelőző 6 munkes 6 segéd.</p> <p>Munkagép: 150bcet, 1 ZCB, 2 teherelő.</p> <p>Munkavégzés:</p> <p>- Alföldi utcában kockokő alapozások betonozása kockokő rakása fugázása akthben kockokő bontása dekapálóval hordása, utalop elkészítése tömörítéssel, sitt szállításai, víznyelő fedlap szintbe helyezése.</p> 
2014. 11. 04 Kedd	<p>Időjárás: +4°C +15°C Napos</p> <p>Értékm: 20 fő: 1 építési vezető, 3 teherelőző, 16 ipkerelő, 1 munkes 8 segéd.</p> <p>Munkagép: 3 teherelő, 150bcet, 1 ZCB</p> <p>Munkavégzés:</p> <p>- Alföldi utcában kockokő fugázása, akthelt utpajza betonozása, 20cm szim előtti döntött szegély készítése fugázása és mellette lény kockokő kiszállítására.</p> <p>Kivitelezői bejegyzés:</p> <p>- Alföldi utcában 16-18 méter távolságra szomszédos szomszédos földalati vezeték járulása miatt a parkdől és az utast mennyiség akkori szomszéd a szomszédos miatt annak elkészül észt feltárták a földalati vezetékek művek munkatársai kérik az akkori munkatársakról mielőbbi helyreállítását.</p>

Az építmény megnevezése: utépítés
 címe: Budapest VIII ker. Alföldi, Sankárocska

ÉPÍTÉSI NAPLÓ Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 23

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.11.04 Kedd	- Alföldi utcában 2 db, mélyvíz okna mintre helyezésre beszerése //
2014.11.05 Szerda	Időjárás: 8, 17, 16°C napos Célnyár: 15 fű 1 művető, 1 gypbelső, 7 mm, 6 mm Gyep: 1 Bobcat Munkavégzés: Csatározás alatti vizsgálata, bent van C/T utóvizelése. Fiberműt parabolok vizsgálata. 16-18 napon előtti parabolok elhelyezése elvégezése. 16-18 napon előtti parabolok Csatározás bent van, drótkövek dephelyezése. Terület takarítása //
2014.11.06 Csütörtök	Időjárás: 8, 15, 12°C napos Célnyár: 10 fű 1 művető, 1 gypbelső, 4 mm, 4 mm Gyep: 1 SCB; 1 Core Munkavégzés: Fiberműt parabolok vizsgálata bent van 16-18 napon előtti parabolok műanyagcsatlakozás befejezése. Parabolok Csatározás bent van, C/T befejezése. Terület takarítása, söpör Sűrűnfejték anyagok és erdőtű elhelyezése. Rögzítés: 16 és 18 as házhoz erősítők elhelyezése Rögzítés és parítás után helyreállítási munkák parabolokban. Részlegesen és korlátozott vizsgálatok, vizsgálat //
	Műszaki Ellenőri bejegyzés: Alföldi u. 16. és 18. sz. házak emeleti lefolyócsatlakozás körüli megrendelő bekötési a csatorna hálózatra (összesen 4 db bekötés), és a bekötést helyre állítani.

Az építmény megnevezése: Utquitas
 címe: Alföldi u. - Szabály u.

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1 A napló oldalszáma: 24

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014. 11.07 Péntek	Időjárás: 8, 15, 12 Levegő: 5 fű 1 méterrel, 2 szm, 2 szm Gépek: Munkavégzés: 16-18 szám erős felhőzet feltárása, ntt hulltása, idomok elhelyezése Terület korlátolása //
2014. 11.08 Szombat	Időjárás: 8, 15, 12 °C Levegő: 5 fű 1 méterrel, 2 szm, 2 szm Gépek: Munkavégzés: 16-18 szám erős felhőzet ntt hulltása, ntt elhelyezése //
2014. 11.09 Vasárnap - 2014. 11.15 Szombat	Munkavégzés nem történt //
2014. 11.16 Vasárnap	Munkavégzés Időjárás: 5, 17, 8 °C Levegő: 5 fű 1 méterrel, 2 szm, 2 szm Gépek: - Munkavégzés: földalatti árok feltárása //
2014. 11.17 Hétfő	Időjárás: 8, 14, 10 °C berendezés Levegő: 15 fű 1 méterrel, 4 gépvel, 5 szm, 5 szm Gépek: 1 fűvel, 2 ütköző, 1 földalatti árok feltárás Munkavégzés: Terület alapozása és korlátolása 2 rétegben árok feltárása építési, korlátolási, csatlakozás szűkítése //

P

Az építmény megnevezése: Utépítéscíme: Aföldi u - Sasbány u

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: 1A napló oldalszáma: 25

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2014.11.18 Kedd	<p>Utépítés: 8, 12, 8²</p> <p>Cetán: 15 f² 1 művető, 4 gipsz, 5 mm, 5 mm</p> <p>Gipsz: 1 finom, 2 ültetés, 1 fűtés és alagsor</p> <p>Műanyag: Sasbány utca kábelháza alagsora</p> <p>2 rétegben arafalt utópalaszintet építve, továbbá</p> <p>csatlakozások beépítése</p> <p>Ellenőrzés</p>
2014.11.19 Szerda	<p>Utépítés: 6, 11, 8²</p> <p>Cetán: 10 f² 1 művető, 2 vofir, 7 mm</p> <p>Gipsz: -</p> <p>Műanyag: Aföldi és Sasbány utcákban</p> <p>kábelháza kábel, esővíz elvezetése</p> <p>Terrálok teljes kábelháza, sít elvezetése</p>
2014.11.20 Csütörtök	<p>Utépítés: 8, 12, 8² nap</p> <p>Cetán: 5 f² 1 művető, 4 mm</p> <p>Gipsz: fűtés</p> <p>Műanyag: Aföldi és Sasbány utcákban</p> <p>elővezetés, forgalmutechnika kábelháza, vezetékes forgalmutechnika</p> <p>elvezetése. Táblák és utcai kábelháza, felfűtés</p>
2014.11.20 Csütörtök	<p>Kivétel: bejegyzés: A mai nappal a kivételről bejegyzés</p> <p>A területen továbbá műanyag nem tartozik. A műanyag leírás</p>
2014.11.27	<p>A mai napon a műszaki átadás-átvételi</p> <p>díjazás megtörtént a fűtési engedély</p> <p>szerint. Az építési naplót mai nappal</p> <p>bezárám. A napló L 2765876-12765300</p> <p>sorszámú oldalainak 1 példányát</p> <p>megrendelő átvette.</p>
